

CERTIFICAAT EINDCONTROLE NA ASBESTVERWIJDERING

De eindcontrole bestaat uit een visuele inspectie. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Deze eindcontrole is uitgevoerd door Flamant Laboratory BV. Op de diensten van Flamant Laboratory BV zijn de leveringsvoorwaarden conform RVOI 2001 van toepassing.

Opdrachtgever

Sanering Advies Bouw Pascal Giesen
Hendrikxstraat 98
5912 BZ VENLO

Rapportnummer

JM12103
datum 26-07-2017
inspecteur J. Martens

Projectgegevens

omschrijving object/bouwwerk: woning
adres Halvedijk 3 Grubbenvorst
aanvangstijd 15:20 uur eindtijd 16:25 uur
inspectietijd onder asbestcondities 00:40 uur

Gesaneerde asbesthoudende toepassingen/materialen (conform werkplan/aanwijzing opdrachtgever)

nr.	onderzochte ruimte(n)	hoeveelheid (±)/materiaal	asbestsoort	HB	%(m/m)
1	dak van woning bron: 1	226m ² dakbeschot	CHR	ja	5-10 /

CHR: chrysotiel, AMO: amosiet, CRO: crocidoliet, OVE: overige soorten asbest/ keramische wol,
n.b.: soort asbest niet bekend, HB: hechtgebonden, %(m/m): gewichtspercentage
+/- : sporen asbest aantoonbaar, +: duidelijk asbest aangetroffen, ++: zeer veel asbest aangetroffen

Risicoklasse en meetprotocol

risicoklasse(n) 1 2 2A

Uitsluitingen

spouwmuren - motorisch gedeelte kraan - asbestverdachte buis op het dak - raamkozijnen deels afgeplakt met folie en tape

Disclaimer: Uitsluitingen zijn niet onderzocht en maken derhalve geen deel uit van deze inspectie.

Resultaten(samenvatting)

visuele inspectie ja nee: zie uitsluitingen goedgekeurd

Rapportnummer

JM12103

Conclusie

Op grond van bovenstaande bevindingen kan worden geconcludeerd dat de onderzochte ruimte(n)/ bouwde(e)l(en) **wel** zonder gebruik van adembescherming kan/kunnen worden betreden.

Ondertekening:



J. Martens

Ondertekening opdrachtgever:

Sanering Advies Bouw Pascal Giesen

Rapportnummer

JM12103

Doel

De eindcontrole heeft tot doel vast te stellen of in het onderzochte object/terrein nog visueel waarneembare resten van de gesaneerde asbesthoudende materialen aanwezig zijn en of het onderzochte object/terrein kan worden vrijgegeven voor het betreden zonder beschermende middelen. De eindcontrole heeft plaatsgevonden na het saneren van de asbesthoudende materialen.

Ingangscontrol

projectnummer opdrachtgever	2017-111
inventarisatierapport aanwezig	ja
valide sloopmelding aanwezig	ja
werkplan aanwezig	ja
sanering uitgevoerd conform werkplan en/of inventarisatierapport	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> , reden:
weersgesteldheid	droog
conform NEN 2990	ja
aanvullingen en/of afwijkingen	container in het werkgebied is rondom en onder geïnspecteerd

Inspectiegebied

totale oppervlakte inspectiegebied	500 m ²
------------------------------------	--------------------

Optionele kleefmonstername

aantal genomen kleefmonsters	-- stuks
------------------------------	----------

Koppeling rapportage

nee
 ja, namelijk aan rapportage(s) met kenmerk(en)

Rapportnummer

JM12103

Visueel geïnspecteerde onderdelen

Segmentatie	1	2
Plafond/ dak (constructie)	+	+
Kabelgoten/ doorvoeringen	N	N
Ventilatiekanalen	N	N
Buizen/ leidingwerk	+	+
Verwarmingselementen	N	N
Kozijnen	+	+
Plinten	N	N
Vloer	+	+
Machines/installaties	N	N
Kruipruimte	N	N
Wanden/muren	+	+
Overige	+	+
Gereedschap/hulpmiddelen	+	+
(afval) transit-route	N	N
Vuile ruimte deco-unit	+	N
Aantal m2	250	250

Toelichting symbolen

toelichting keuze "overige": folie en tape van afgeplakte delen

+ direct in orde bevonden
+2 in orde bevonden na schoonmaak

A afgekeurd vanwege aantreffen van asbestrestanten
Z afgekeurd wegens andere reden (zie opmerkingen)
N niet aanwezig en/of niet onderzocht

Rapportnummer

JM12103

Resultaten

Visuele inspectie

- goedgekeurd de onderzochte ruimte(n) voldoen **wel** aan de criteria zoals gesteld in de NEN2990
 afgekeurd: de onderzochte ruimte(n) voldoen **niet** aan de criteria zoals gesteld in de NEN2990

Additionele monsteranalyse

- goedgekeurd: zie bijlage
 afgekeurd: zie bijlage
 niet van toepassing

Gegevens over de gevolgde inspectieprocedure en bijhorende prestatiekenmerken kunnen bij Flamant Laboratory BV worden opgevraagd. Documentatie ten behoeve van de inspectiewerkzaamheden wordt in digitale vorm 7 jaar bewaard. De monsters worden 2 maanden bewaard. Niets uit deze rapportage mag gereproduceerd worden, tenzij volledig, zonder schriftelijke toestemming van Flamant Laboratory BV. Deze verrichting valt binnen de scope van het accreditaat I189 en/of L503.

Opmerkingen/notities


--

Bijlagen

Geen

Rapportnummer

JM12103

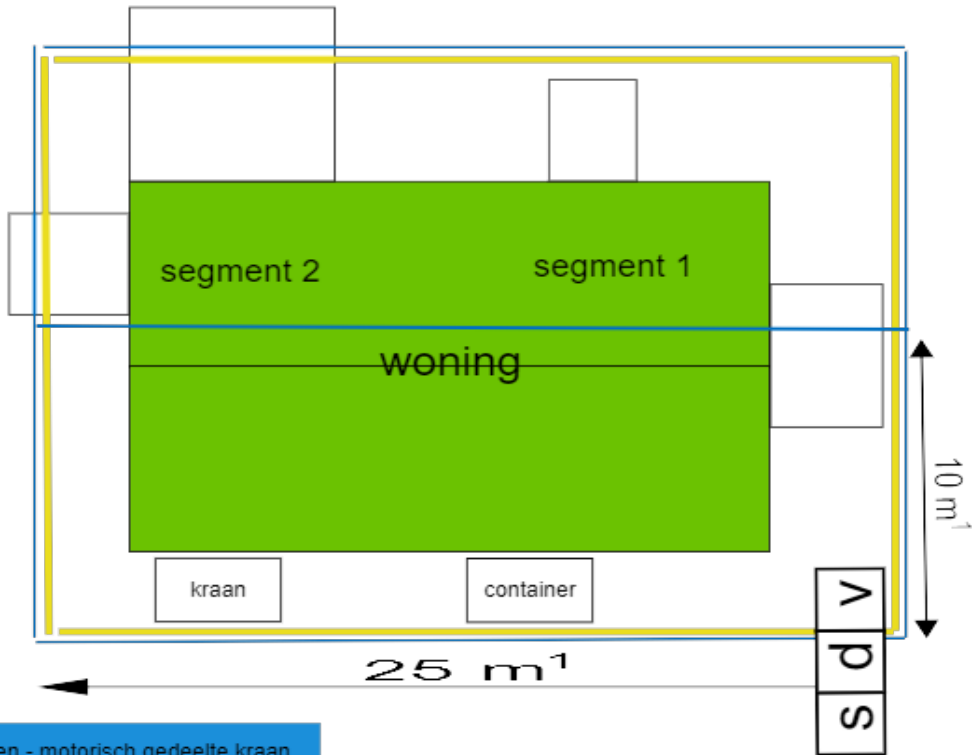

spouwmuren - motorisch gedeelte kraan
 - asbest verdachte buis op het dak -
 raamkozijnen deels afgeplakt met folie
 en tape

tekening is indicatief
 en niet op schaal

- | | | | | | |
|---------------|--|----------------|--|---------------|--|
| luchtpomp: | | gesaneerd: | | afzetlint: | |
| kleefmonster: | | uitsluitingen: | | metrage: | |
| containment: | | asbest: | | segmentatie: | |
| deco-unit: | | onderdruk: | | transitroute: | |

Rapportnummer

JM12103



toelichting foto: afzetlint - steiger



toelichting foto: afzetlint - steiger



toelichting foto: plaats waar is gesaneerd



toelichting foto: plaats waar is gesaneerd

Rapportnummer

JM12103



toelichting foto: plaats waar is gesaneerd - asbest
verdachte buis uitgesloten van inspectie - raamkozijnen
deels afgeplakt met folie en tape

toelichting foto: vloer van de steiger



toelichting foto: plaats waar is gesaneerd

toelichting foto: plaats waar is gesaneerd

Rapportnummer

JM12103



toelichting foto: plaats waar is gesaneerd - folie tijdens inspectie laten verwijderd



toelichting foto: spouwmuur uitgesloten van inspectie



toelichting foto: plaats waar is gesaneerd



toelichting foto: plaats waar is gesaneerd

Rapportnummer

JM12103



toelichting foto: kraan - motorisch gedeelte uitgesloten
